

2016

BILAN OPERATIONNEL PAI



Association Renouveau Teasoa

Sommaire

Ordinogramme

Ordinogramme page 02

1. Introduction

1.1 Les orientations politiques page 03

1.2 Le cadre administratif et politique page 03

1.3 Le paramétrage financier page 05

1.4 La mise à disposition des fonds subventionnels page 05

2. L'activité opérationnelle

2.1 Les demandeurs page 06

2.2 Les attributaires..... page 07

2.3 Les bénéficiaires page 10

3. Conclusions et perspectives

Conclusions et perspectives page 13

Annexes


Bilans physiques et financiers

Convention 2013-36/PN

Convention 14C097

Convention 14C414

ORDINOGRAMME RELATIF À L'ENCHAÎNEMENT DES ACTIONS D'UN PROJET ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

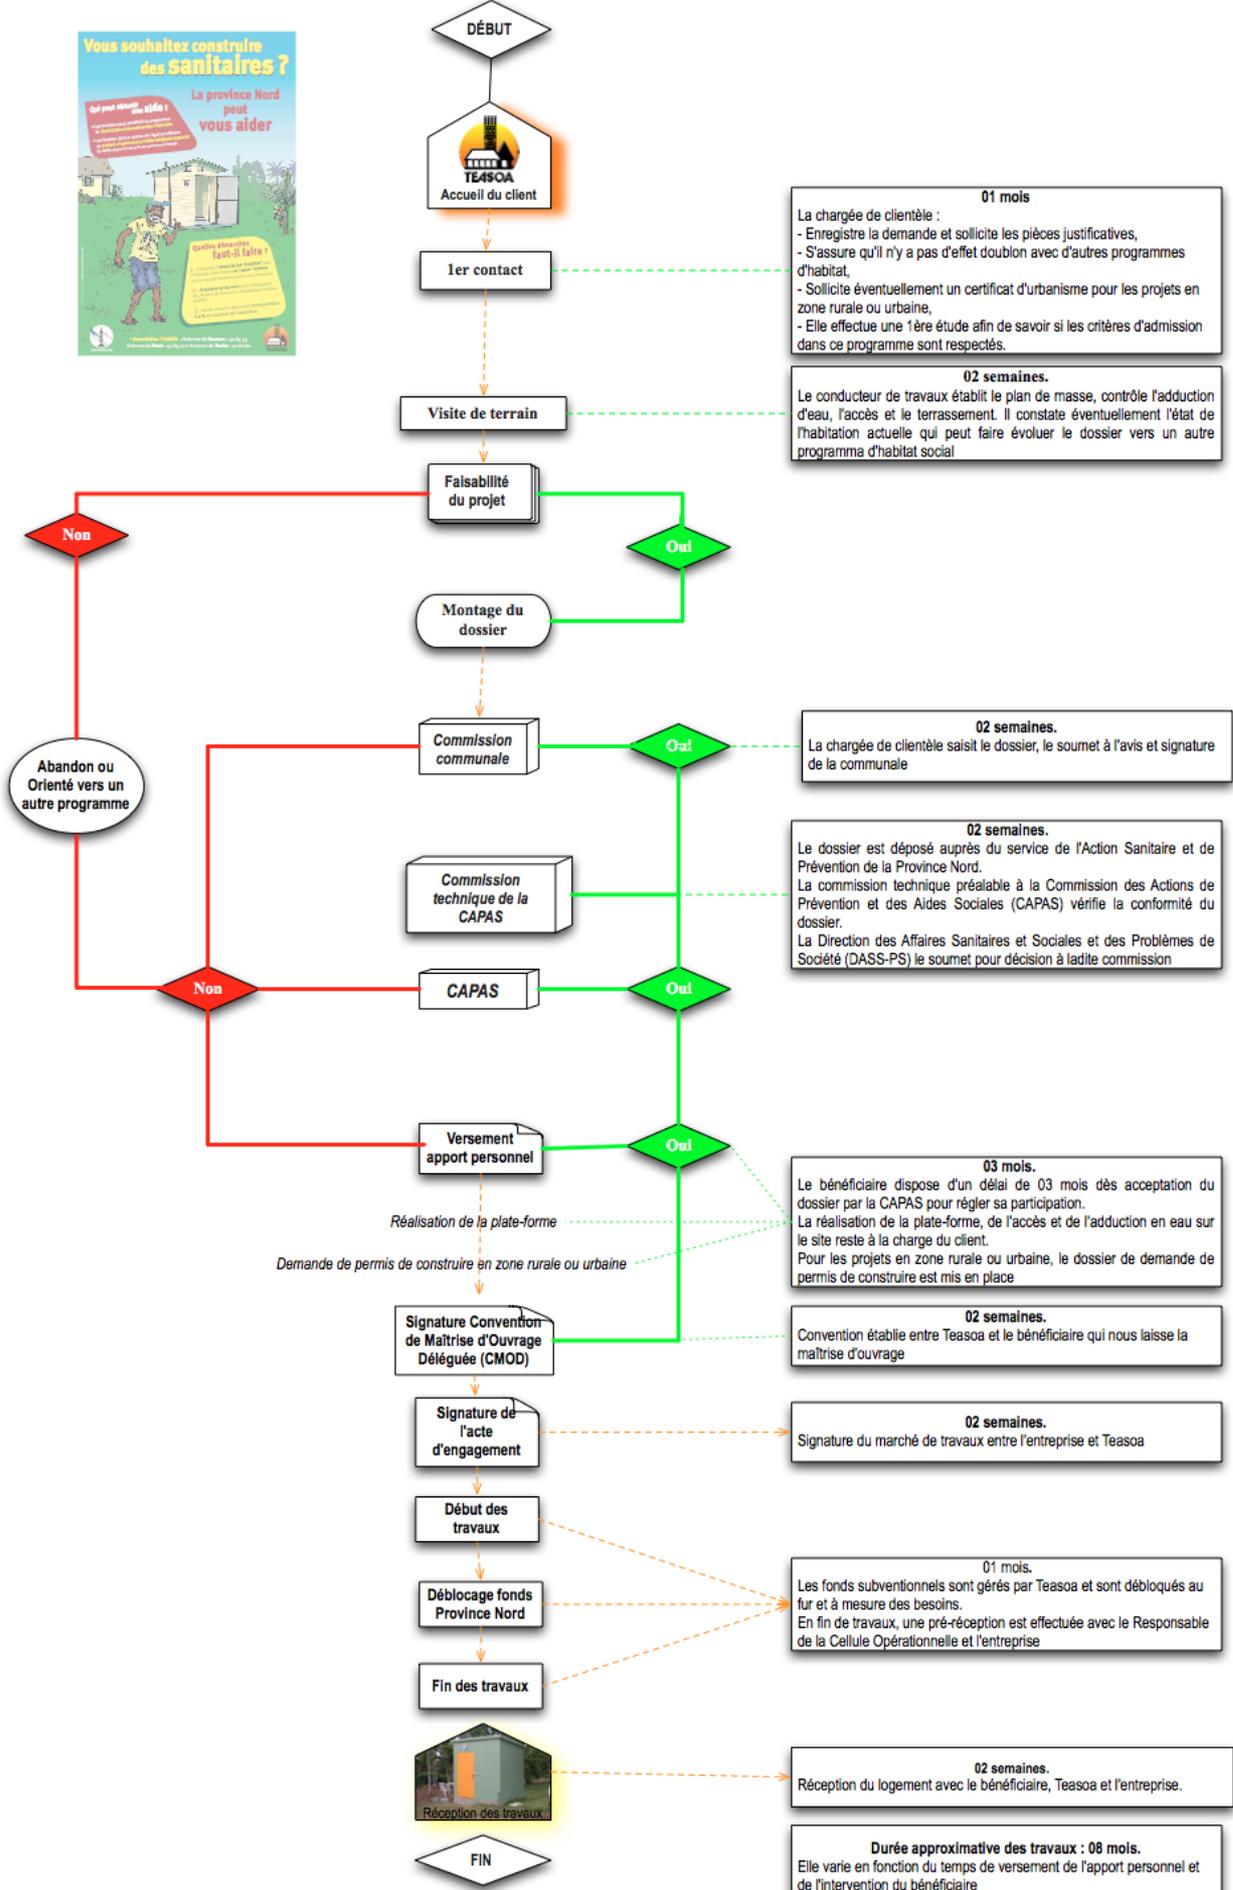

1. Introduction

1.1. Les orientations politiques

Par délibération n° 2008-352/APN du 30 décembre 2008 la Province a institué un programme de construction d'assainissement individuel avec bloc sanitaire pour les populations les plus défavorisées.

Les motivations qui ont conduit la Province à mettre en place ce programme sont développées dans le premier paragraphe du préambule de ladite délibération à savoir, « *La prise en compte de la prévention, facteur de réduction d'apparition des maladies ou des handicaps, permet de réduire les coûts en matière de dépenses de santé et d'améliorer l'état de santé des individus. L'amélioration des conditions d'hygiène du milieu de vie contribue à l'élévation du niveau sanitaire de la collectivité. La construction d'un bloc sanitaire intégrant à la fois un assainissement individuel et un bloc douche sanitaire s'inscrit ainsi dans un schéma de prévention au niveau de l'environnement et de l'épanouissement de l'individu* ».

Ce programme fait donc suite aux différents dispositifs engagés depuis le début des années 1990 par la Province dans le domaine de l'assainissement individuel. Il se différencie néanmoins des dispositifs précédents par le fait qu'il propose désormais un produit entièrement fini.

1.2. Le cadre administratif et juridique


Le 13 mars 2009, la Province a choisi TEASOA pour être l'opérateur de ce programme (délibération n° 2009-124/APN).

C'est seulement le 23 juin 2009 qu'une convention a été signée entre la Province et TEASOA (convention n° 09C094). Les principales missions confiées à l'opérateur sont notamment les suivantes :

- La constitution des dossiers et le suivi des validations par la CAPAS (Commission des Actions de Prévention et des Actions Sociales) ;
- La conduite effective de l'opération sur le terrain : actions d'information, de conseil, d'accompagnement sur les plans administratif, financier et technique auprès de la population et des communes selon les dispositions générales et critères d'attribution définies par la délibération cadre n° 2008-352/APN du 18 décembre 2008 ;
- La maîtrise des travaux entrant dans ce dispositif;
- La gestion des fonds subventionnels destinés au financement des opérations et des produits financiers en découlant en provision des imprévus ;
- La gestion des fonds privés.

Le 18 février 2011, l'Assemblée de la Province Nord a autorisé le Président à signer un avenant à la convention susmentionnée pour la tranche 2011 (délibération n° 2011-18/APN).

L'avenant n°1 qui a été retourné à la Province le 29 avril 2011 revêtu de notre approbation, reconduit les objectifs, rôles, champs d'intervention, financement et modalités de liquidation, cahier des charges et obligation de l'opérateur de la convention initiale pour la tranche 2011,



à charge pour ce dernier d'achever la programmation dans un délai de trois ans, soit au 31 décembre 2013 terme de rigueur. C'est seulement le 23 janvier 2012 que cet avenant a été signé par le Secrétaire Général Adjoint, soit près de 9 mois plus tard.

Dans le courant du mois de novembre 2012, des discussions ont été engagées entre la Direction de la DASS-PS et l'opérateur concernant la rédaction et les modalités d'application d'une nouvelle convention pour l'exercice 2013 à l'instar du travail qui avait été fait avec la Direction de la DAF.

C'est seulement le 5 juin 2013, soit quasiment à la moitié de l'exercice, que la convention n° 2013-36/PN a été signée par la Province. Elle nous a été notifiée le 26 juillet suivant. Désormais, la convention sera annuelle et éventuellement renouvelée par l'établissement d'une nouvelle convention. Néanmoins, les objectifs techniques et les missions confiées à l'opérateur restent dans l'ensemble identiques à ceux fixés par la convention de 2009 et son avenant. Le principal changement concerne les produits financiers qui doivent être restitués désormais à la Province à la fin de l'exercice.

Immédiatement après la notification de la convention, l'opérateur a sollicité la Direction de la DASS-PS pour modifier les modalités de versement de sa rémunération. Un avenant a ainsi été rédigé et signé le 11 septembre 2013.

Pour 2014, on constate une amélioration, par rapport à l'exercice précédent, dans le circuit administratif de signature et de notification de la convention n° 14C097. En effet, cette dernière a été signée le 22 mai et nous a été notifiée le 4 juin 2014. Par ailleurs, cette convention diffère quelque peu au niveau de sa rédaction mais reste quasiment identique sur le fond à celle de 2013.

Le circuit administratif de signature et de notification de la convention 2015 (14C414) s'est encore amélioré en termes de délai par rapport à celui de l'exercice précédent. En effet, la convention a été signée le 26 mars et notifiée le 31 mars 2015. La rédaction de la convention 2015 reste identique à celle de la précédente.

Quant au dernier exercice, il a commencé dans l'incompréhension la plus totale. En effet, l'Association a été informée par courrier daté du 3 février 2016 de la décision de la Province de surseoir à la signature de la convention 2016 afin de procéder à une évaluation de son dispositif.

Cette décision est inexplicable tant sur le fond que sur la forme.

Sur le fond, ce programme présente un bilan plus que positif. Alors pourquoi avoir voulu suspendre ce programme pour au moins une année ? Les bilans ont été transmis régulièrement à la Province qui ne pouvait donc pas ignorer les excellents résultats obtenus par l'opérateur et la qualité de son travail effectué sur le terrain. Avait-on besoin d'une année pour faire une évaluation de ce dispositif ?

Sur la forme, nous avons constaté une fois de plus le peu de considération de la Province pour son opérateur et partenaire. Nous aurions pu être avertis au préalable (avant la fin de l'exercice 2015) ou la réflexion aurait pu être menée par la Province sans pour autant suspendre ce programme car en agissant ainsi la Province a privé l'opérateur d'une rémunération annuelle de 9,6 millions XPF.

Le Directeur a rencontré le Directeur de la DASS-PS courant mars. Il lui a fait part de son incompréhension et proposé a minima la signature d'une convention semestrielle dans laquelle bien entendu la dotation en fonds subventionnels et la rémunération seraient divisées par deux. Aucune suite n'a été donnée à cette entrevue.

En outre, le Directeur a sollicité par deux fois un entretien auprès du Président de la Commission de la Santé, demandes qui n'ont jamais abouties.

Ceci étant, même en l'absence de convention, il a été décidé lors de notre Conseil d'Administration du 18 avril 2016 de poursuivre, au moins au cours de cet exercice, la gestion de ces opérations afin que les derniers bénéficiaires de ce dispositif ne soient pas pénalisés par la décision provinciale.

1.3. Le paramétrage financier

La dotation provinciale pour le financement des travaux relatifs à ce programme, allouée à l'opérateur à chaque convention ou avenant est de 80 millions XPF, hors rémunération de l'opérateur. Cette enveloppe a été définie pour permettre la réalisation, par convention ou avenant, de 60 blocs sanitaires au coût unitaire de 1 329 300 XPF (coût établi en décembre 2008), pour lequel le ménage bénéficiaire devra contribuer financièrement à hauteur de 1 %.

La convention de 2014 fixe le coût du bloc sanitaire à 1 520 000 XPF. Ce réajustement a été opéré pour tenir compte de l'augmentation de l'indice BT21 entre fin 2008 et fin 2013. Par ailleurs, pour la première fois, la convention introduit la notion de zone éloignée dans laquelle le coût du bloc sanitaire est majoré de 20 % pour être porté à 1 824 000 XPF. L'apport personnel est fixé à 1 % du coût du bloc sanitaire dans la limite de 15 200 XPF. Par contre, l'enveloppe allouée à ce programme reste la même, à savoir 80 millions XPF, ce qui doit nous permettre de réaliser annuellement entre 44 et 53 blocs sanitaires.

La convention 2015 fixe le coût du bloc sanitaire à 1 674 000 XPF. Cet ajustement a été opéré pour tenir compte de l'augmentation du coût du système d'assainissement en raison de son redimensionnement pour les terres coutumières dans le but de garantir un meilleur traitement des eaux usées avant leur rejet dans la nature afin d'être en conformité avec le code provincial de protection de l'environnement. Par ailleurs, la notion de zone éloignée est maintenue dans laquelle le coût du bloc sanitaire est majoré de 20 % pour être porté à 2 008 800 XPF. L'apport personnel quant à lui est toujours fixé à 1 % du coût du bloc sanitaire avec un plafond de 16 740 XPF. Enfin, l'enveloppe allouée à ce programme reste la même, à savoir 80 millions XPF, ce qui doit nous permettre de réaliser annuellement entre 40 et 47 blocs sanitaires.

Bien évidemment, en 2016 en raison de l'absence de convention, le coût du bloc sanitaire n'a pas été réévalué.

1.4 La mise à disposition des fonds subventionnels

Le premier acompte d'un montant de 44,8 millions XPF a été appelé le 2 juillet 2009 et les fonds ont été crédités sur notre compte que le 14 avril 2010, soit près de 9,5 mois plus tard.

Le second appel de fonds du même montant a été adressé à la Province le 5 septembre 2011 et crédité le 25 octobre suivant engageant ainsi la totalité des fonds de la convention initiale (convention n° 09C094 du 23 juin 2009).

Le premier appel de fonds de l'avenant n° 1 à la convention ci-dessus désignée, d'un montant de 44,8 millions XPF a été adressé à la Province le 30 janvier 2012 et les crédits nous sont parvenus que le 31 mai suivant, c'est-à-dire 4 mois plus tard.

Le deuxième et dernier appel de fonds, du même montant, relatif à l'avenant n° 1 date du 5 novembre 2012. A la fin de l'exercice, les fonds n'étaient toujours pas versés. En conséquence, l'opérateur a été dans l'incapacité de payer les entreprises à compter de cette date jusqu'à la réception des crédits le 21 février 2013. Le temps nécessaire au versement de ces fonds par la Province a été de 3,5 mois alors que le Directeur de Teasoa avait alerté la Direction de la DASS-PS au cours d'une réunion de travail le 15 novembre 2012 sur l'urgence du règlement de cet acompte sinon il serait obligé de suspendre très rapidement le paiement des travaux aux entreprises.

Le premier appel de fonds relatif à la convention n°2013-36 PN, d'un montant de 40 millions XPF, a été effectué le 26 juillet 2013 et crédité sur notre compte le 26 août suivant. Le second et dernier appel de fonds, du même montant que le premier, relatif à la convention ci-dessus mentionnée a été dressé le 14 janvier 2014 et crédité sur notre compte le 29 avril suivant.

Concernant la convention n°14C097, le premier appel de fonds d'un montant de 40 millions XPF a été effectué le 26 août 2014 et crédité sur notre compte le 28 novembre suivant. Le second et dernier appel de fonds, du même montant que le premier, relatif à la convention ci-dessus mentionnée a été dressé le 5 novembre 2014 et crédité sur notre compte le 29 décembre suivant.

Le premier appel de fonds relatif à la convention n°14C414 (convention 2015), d'un montant de 40 millions XPF, a été effectué le 31 mars 2015 et crédité sur notre compte le 22 juin suivant. A la clôture de l'exercice, le second et dernier appel de fonds, du même montant que le premier, relatif à la convention ci-dessus mentionnée n'avait toujours pas été dressé. En effet, le compte bancaire affichait un solde de près de 109 millions XPF. Or, conformément à l'article 7 de la convention, c'est uniquement lorsque le solde du compte bancaire est égal ou inférieur à 40 millions XPF que l'opérateur est autorisé à effectuer l'appel de fonds.

En 2016, aucun appel de fonds n'a été adressé à la Province compte tenu de ce qui précède. Au cours de l'exercice, les disponibilités en banque nous ont permis de financer les travaux de construction de 22 blocs sanitaires. A la fin de l'année, le solde bancaire était de l'ordre de 81,7 millions XPF.

2. L'activité opérationnelle

2.1 Les demandeurs

Un ménage est considéré comme « demandeur » de la date d'enregistrement de sa demande auprès de l'opérateur jusqu'à la validation de son projet par la CAPAS ou de la résiliation de sa demande.

Globalement, la demande fluctue en fonction :


- Des nouvelles inscriptions ;
- Des résiliations ;
- De la validation ou de la non-validation des projets par la CAPAS.

Depuis 2009, sur l'ensemble de la Province, le nombre de demandes enregistré par l'opérateur est de 484. Sur les communes de Canala, Koné et Poya, le nombre de demandeurs dépasse la cinquantaine. A l'inverse, ce nombre est inférieur à la dizaine sur les communes de Kouaoua, Koumac et Voh. Il est même quasiment nul sur Pouembout.

Évolution de la demande à fin 2016


Communes	Années								Ensemble
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Belep	4	1	12	8	2	2	2	2	33
Canala	9	21	8	9	6	2	3	0	58
Hienghène	8	7	4	1	0	2	1	0	23
Houailou	1	3	10	13	4	1	2	1	35
Kaala-Gomen	3	1	2	1	7	0	5	0	19
Koné	12	7	8	17	8	0	2	0	54
Kouaoua	0	3	0	1	1	0	0	0	5
Koumac	1	2	1	0	4	0	0	0	8
Ouégoa	3	5	10	1	5	0	4	0	28
Poindimié	5	3	8	2	7	2	3	0	30
Ponérihouen	3	4	2	11	8	0	0	1	29
Pouébo	6	3	6	4	6	4	2	0	31
Pouembout	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Poum	10	1	3	6	1	0	4	0	25
Poya	22	6	15	3	12	0	1	0	59
Touho	4	12	8	2	6	3	6	1	42
Voh	0	0	3	0	1	0	0	0	4
Ensemble	91	79	100	79	79	16	35	5	484

Entre 2013 et 2014, le nombre de demandeurs a chuté de près de 80 % passant ainsi de 79 à 16. Ce fort recul s'explique par la diminution de la demande elle-même et l'archivage des dossiers en instruction qui n'avaient pas progressé au cours des 12 derniers mois. En 2015, la tendance est repartie à la hausse pour atteindre les 35 demandeurs à la clôture de l'exercice. Les 5 demandes enregistrées en 2016 l'ont été au début de l'année avant d'avoir eu connaissance de la décision de la Province de surseoir à la signature de la convention.

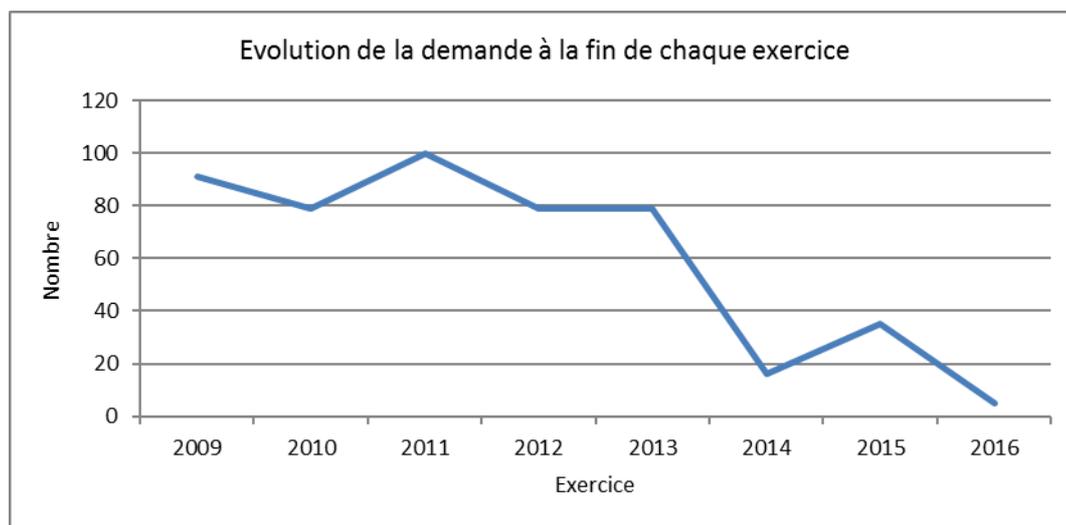

2.2. Les attributaires

Un ménage est considéré comme « attributaire » dès lors que son projet est validé par la CAPAS jusqu'à la signature de la Convention de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée (CMOD) qui intervient uniquement après le versement de l'apport personnel de l'attributaire.

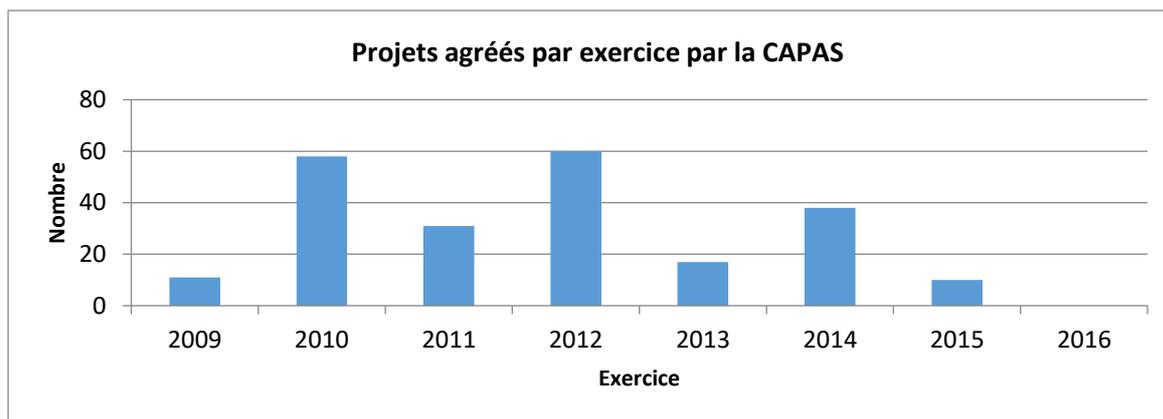

Les onze premiers projets ont été validés en décembre 2009.

En 2010, la CAPAS a agréé 58 autres projets dont 50 lors de la réunion du 6 décembre.

En 2011, seulement 32 dossiers ont été retenus par la CAPAS. Néanmoins, ce sont probablement 70 projets qui auraient dû être validés par cette dernière si elle avait accepté d'examiner les dossiers déposés par l'opérateur au cours du second semestre de l'exercice. En effet, la CAPAS au cours de ses réunions du 26 septembre et du 5 décembre a refusé d'examiner les dossiers instruits par l'opérateur au motif que :

- La cadence de production était insuffisante ;
- La validation de ces nouveaux dossiers allait porter l'engagement de la collectivité à près de 183 millions XPF soit 14,3 % de plus que l'enveloppe prévue à la convention 2009 et à son avenant n°1 (160 millions XPF) ;
- Elle devait donc, de ce fait, redéfinir ses critères d'attribution.

En 2012, l'examen des dossiers n'a repris que le 18 juillet lors d'une réunion de la Commission de la Santé suite à la demande de l'opérateur pour permettre la poursuite de l'activité de production sans rupture maintenant que le rythme de cette dernière s'approchait des 60 unités annuelles telle que prévue à la convention. Par la suite, dans le courant du second semestre, la CAPAS a également validé des dossiers au cours de deux tenues. Ainsi, ce sont au total 60 projets qui ont été validés en 2012, soit un peu plus qu'en 2010.

Malheureusement, en 2013, 17 dossiers seulement ont été validés par la CAPAS au cours de deux séances en mars et en juillet.

En 2014, le nombre de dossiers agréés au cours de trois commissions (mars, août et novembre) est de 38 soit le double que l'exercice précédent.


Au cours de l'exercice 2015, la CAPAS a validé 4 projets lors de sa séance du 25 mars et 5 au cours de celle du mois d'octobre.

En raison de la décision de la Province de ne pas renouveler la convention, aucun dossier n'a été présenté à l'avis de la CAPAS en 2016.

Projets agréés par commune de 2009 à 2016

Communes	Nombre de dossiers agréés	Projets agréés			Ensemble	Financements				Ensemble
		Tribus		Hors tribu		Province Nord		Participation des ménages		
		Nombre	%			Montant en XPF	%	Montant en XPF	%	
Belep	19	19	100	0	19	26 482 512	99%	258 288	1%	26 740 800
Canala	23	23	100	0	23	31 063 507	99%	311 093	1%	31 374 600
Hienghène	13	13	100	0	13	17 485 677	99%	176 623	1%	17 662 300
Houaïlou	7	7	100	0	7	9 212 049	99%	93 051	1%	9 305 100
Kaala-Gomen	15	15	100	0	15	22 693 415	99%	223 085	1%	22 916 500
Koné	15	15	100	0	15	19 932 858	99%	202 842	1%	20 135 700
Kouaoua	1	1	100	0	1	1 316 007	99%	13 293	1%	1 329 300
Koumac	2	2	100	0	2	2 632 014	99%	26 586	1%	2 658 600
Ouégoa	13	11	85	2	13	17 674 470	99%	178 530	1%	17 853 000
Poindimié	23	22	96	1	23	31 212 126	99%	315 274	1%	31 527 400
Ponérihouen	10	9	90	1	10	14 523 242	99%	140 558	1%	14 663 800
Pouébo	20	20	100	0	20	29 150 625	99%	278 475	1%	29 429 100
Pouembout	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-
Poum	18	17	93	1	18	25 166 505	99%	244 995	1%	25 411 500
Poya	15	15	100	0	15	20 421 691	99%	203 209	1%	20 624 900
Touho	30	30	100	0	30	40 612 968	99%	410 232	1%	41 023 200
Voh	1	1	0	0	1	1 504 800	99%	15 200	1%	1 520 000
Ensemble	225	220	98	5	225	311 084 466	99%	3 091 334	1%	314 175 800

Au total, ce sont donc 225 projets qui ont été agréés par la CAPAS depuis 2009. Ils sont prévus à 98 % en zone tribale. Au fil des années, ce programme a pris de l'importance, comme par exemple sur la commune de Touho où le nombre de dossiers agréés atteint la trentaine. À l'inverse, sur la commune de Pouembout aucun projet n'a été agréé et sur celle de Voh un seul. Le montant des travaux des projets retenus par la CAPAS atteint presque les 314 millions XPF financés à 99 % par la Province (311 millions XPF).

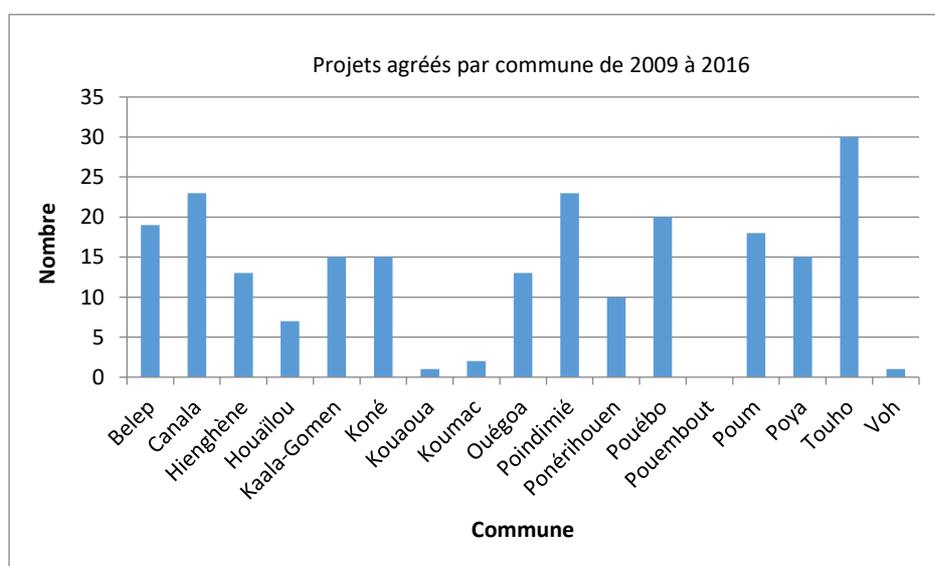

Depuis 2009, le montant des subventions validé par la CAPAS (311 millions XPF) représente 77 % de l'ensemble des dotations conventionné (400 millions XPF).

Au cours d'un exercice, le nombre d'attributaires fluctue en fonction :

- Du nombre de projets validés par la CAPAS ;
- De la constitution des apports ;
- Du nombre de projets éventuellement annulés par la CAPAS.

A la fin de l'exercice 2016, les attributaires sont au nombre 2. Cela s'explique par le faible nombre de dossiers validés par la CAPAS au cours exercice 2015 et l'absence de validation en 2016.

Par ailleurs, dix projets ont été annulés soit sept pour non constitution de l'apport, un à la demande de l'attributaire et deux en raison du décès de l'attributaire.

2.3. Les bénéficiaires

Un ménage est considéré comme « bénéficiaire » de la signature de la CMOD à la réception de son projet.

Au cours d'un exercice, le nombre de bénéficiaires fluctue en fonction :

- Du nombre de CMOD signées. Pour mémoire, la signature de la CMOD ne peut se faire qu'après le versement de l'apport personnel ;
- De la livraison du nombre de projets.

Ainsi, à la fin de l'année 2016, le nombre de bénéficiaires est de 8.


Projets livrés par commune en 2016

Communes	Nombre de dossiers agréés	Projets livrés								Ensemble	
		Tribus		Hors tribu	Ensemble	% des chantiers livrés par rapport aux dossiers agréés	DASS-PS		Participation des ménages		
		Nombre	%				Montant en XPF	%	Montant en XPF		%
Belep	19	2	100%	0	2	11%	3 617 600	99%	30 400	1%	3 648 000
Canala	23	0	-	0	0	-	0	-	0	1%	0
Hienghène	13	0	-	0	0	-	0	-	0	1%	0
Houaïlou	7	0	-	0	0	-	0	-	0	1%	0
Kaala-Gomen	15	3	100%	0	3	20%	4 971 780	99%	50 220	1%	5 022 000
Koné	15	0	-	0	0	-	0	-	0	1%	0
Kouaoua	1	0	-	0	0	-	0	-	0	1%	0
Koumac	2	0	-	0	0	-	0	-	0	1%	0
Ouégoa	13	1	100%	0	1	8%	1 316 007	99%	13 293	1%	1 329 300
Poindimié	23	2	100%	0	2	9%	3 009 600	99%	30 400	1%	3 040 000
Ponérihouen	10	4	100%	0	4	40%	5 698 600	99%	56 986	1%	5 755 586
Pouébo	20	1	100%	0	1	5%	1 808 800	99%	15 200	1%	1 824 000
Pouembout	0	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0
Poum	18	0	-	0	0	-	-	-	-	1%	-
Poya	15	0	-	0	0	-	0	-	0	1%	0
Touho	30	2	100%	0	2	7%	3 009 600	99%	30 400	1%	3 040 000
Voh	1	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0
Ensemble	225	15	100%	0	15	7%	23 431 987	99%	226 899	1%	23 658 886


Projets livrés par commune de 2009 à fin 2016


Communes	Nombre de dossiers agréés	Projets livrés								Ensemble	
		Tribus		Hors tribu	Ensemble	% des chantiers livrés par rapport aux dossiers agréés	DASS-PS		Participation des ménages		
		Nombre	%				Montant en XPF	%	Montant en XPF		%
Belep	19	17	100%	0	17	89%	23 348 405	99%	229 795	1%	23 578 200
Canala	23	23	100%	0	23	100%	31 063 507	99%	311 093	1%	31 374 600
Hienghène	13	12	100%	0	12	92%	15 980 877	99%	161 423	1%	16 142 300
Houaïlou	7	7	100%	0	7	100%	9 389 849	99%	93 051	1%	9 482 900
Kaala-Gomen	15	14	100%	0	14	93%	21 377 408	99%	209 792	1%	21 587 200
Koné	16	14	100%	0	14	88%	18 424 098	99%	186 102	1%	18 610 200
Kouaoua	1	1	100%	0	1	100%	1 316 007	99%	13 293	1%	1 329 300
Koumac	2	0	0%	1	1	50%	1 316 007	99%	13 293	1%	1 329 300
Ouégoa	13	11	85%	2	13	100%	17 978 470	99%	178 530	1%	18 157 000
Poindimié	23	19	100%	0	19	83%	24 925 319	99%	256 381	1%	25 181 700
Ponérihouen	10	8	100%	0	8	80%	10 920 542	99%	110 158	1%	11 030 700
Pouébo	19	17	100%	0	17	89%	23 357 705	99%	229 795	1%	23 587 500
Pouembout	0	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0
Poum	18	18	100%	0	18	100%	25 166 505	99%	244 995	1%	25 411 500
Poya	15	12	100%	0	12	80%	15 980 877	99%	161 423	1%	16 142 300
Touho	30	29	100%	0	29	97%	39 296 961	99%	396 939	1%	39 693 900
Voh	1	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0
Ensemble	225	202	99%	3	205	91%	279 842 537	99%	2 796 063	1%	282 638 600

Le nombre de projets livrés en 2016 est de 15.

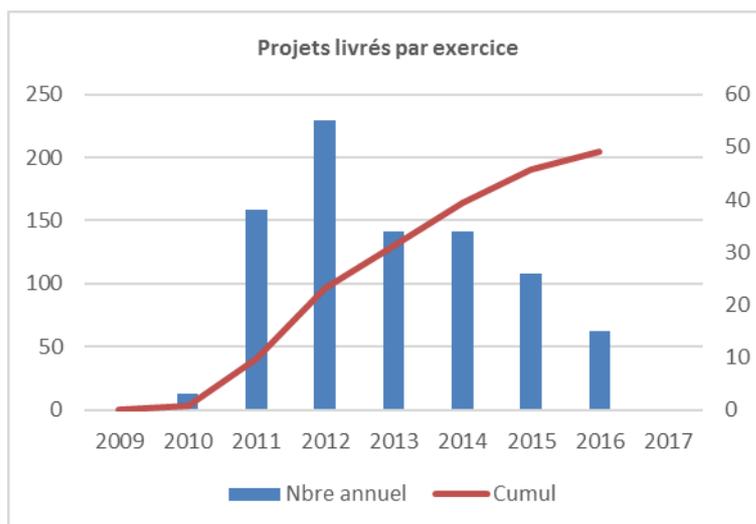

Au 31 décembre 2016, 205 blocs sanitaires étaient livrés soit 91,1 % des projets agréés par la CAPAS. Si l'on fait abstraction des projets annulés ou à annuler ce taux est porté à près de 95,4 %. Ces blocs sanitaires se situent quasiment tous en milieu tribal. Le coût des travaux s'élève à près de 280 millions XPF financé à 99 % par la collectivité provinciale.

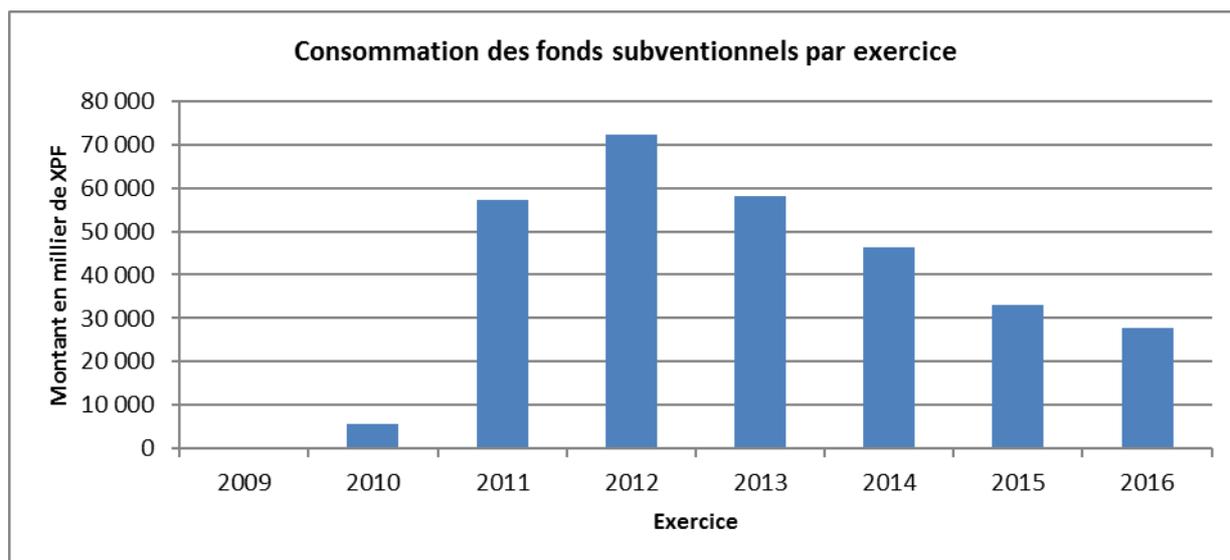

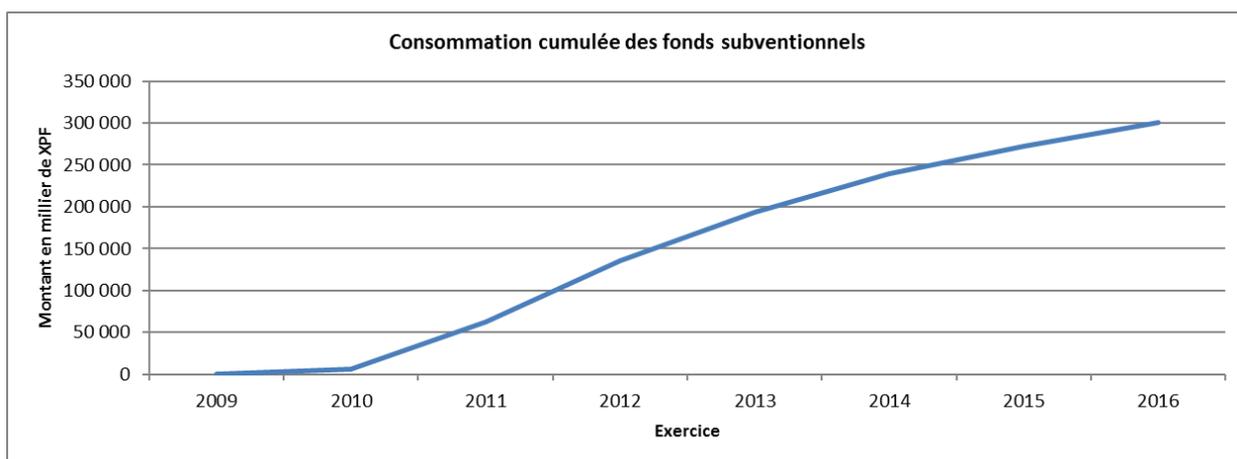

Concernant les fonds subventionnels, au 31 décembre 2016, un peu plus de 300 millions XPF étaient consommés soit 97,6 % de l'ensemble des subventions accordé par la CAPAS depuis 2009.

3. Conclusion et perspectives

Pour atteindre l'objectif affiché de la DASS-PS de livrer 60 unités par an, il aurait fallu que la CAPAS en valide au moins autant par exercice, soit au total 360, si l'on ne tient pas compte de 2009, année de lancement de ce programme et de l'exercice 2016 pour lequel la convention n'a pas été renouvelée.

Or, on est loin du compte. En effet, au 31 décembre 2016, seulement 225 projets avaient été retenus par la CAPAS.

Très rapidement cet objectif est devenu illusoire car la Province a augmenté le coût unitaire d'un bloc sanitaire sans accroître l'enveloppe annuelle des crédits destinés au paiement des travaux. Pour plus de précisions, se reporter à l'article 1.3 de l'introduction.


ÉTAT DES PROJETS VALIDÉS PAR COMMUNE
au 31 décembre 2016


Commune	En attente de constitution de l'apport	En attente de travaux à la charge du bénéficiaire	Nombre de CMOD en préparation	Nombre de marchés en préparation	Nombre de chantiers en cours	Nombre de projets livrés	Nombre de dossiers annulés (a)	Total
Belep	1	0	0	0	0	17	1	19
Canala	0	0	0	0	0	23	0	23
Hienghène	0	0	0	0	1	12	0	13
Houaïlou	0	0	0	0	0	7	0	7
Kaala-Gomen	0	0	0	0	0	14	1	15
Koné	0	0	0	0	1	14	1	16
Kouaoua	0	0	0	0	0	1	0	1
Koumac	0	0	0	0	0	1	1	2
Ouégoa	0	0	0	0	0	13	0	13
Poindimié	0	0	0	1	0	19	3	23
Ponérihouen	0	0	1	0	1	8	0	10
Pouébo	0	0	0	0	3	17	0	20
Pouembout	0	0	0	0	0	0	0	0
Poum	0	0	0	0	0	18	0	18
Poya	0	0	0	0	1	12	2	15
Touho	0	0	0	0	0	29	0	29
Voh	0	0	0	0	0	0	1	1
Total	1	0	1	1	7	205	10	225

Malgré une mise en route laborieuse de ce programme au cours des deux premiers exercices, ce dernier présente aujourd'hui un bilan extrêmement positif.

La production de blocs sanitaires, après une phase de croissance entre 2009 et 2012, puis une période de stabilité en 2013 et 2014, décline fortement depuis 2015. En l'absence de reprise de ce dispositif, elle devrait être nulle à compter de 2018.

Enfin, si on comptabilise les chantiers en cours, ceux qui sont en attente de démarrage des travaux et les projets dont les apports sont en cours de constitution à la fin de l'exercice 2016, le nombre de blocs sanitaires potentiellement livrable en 2017 est de 10.

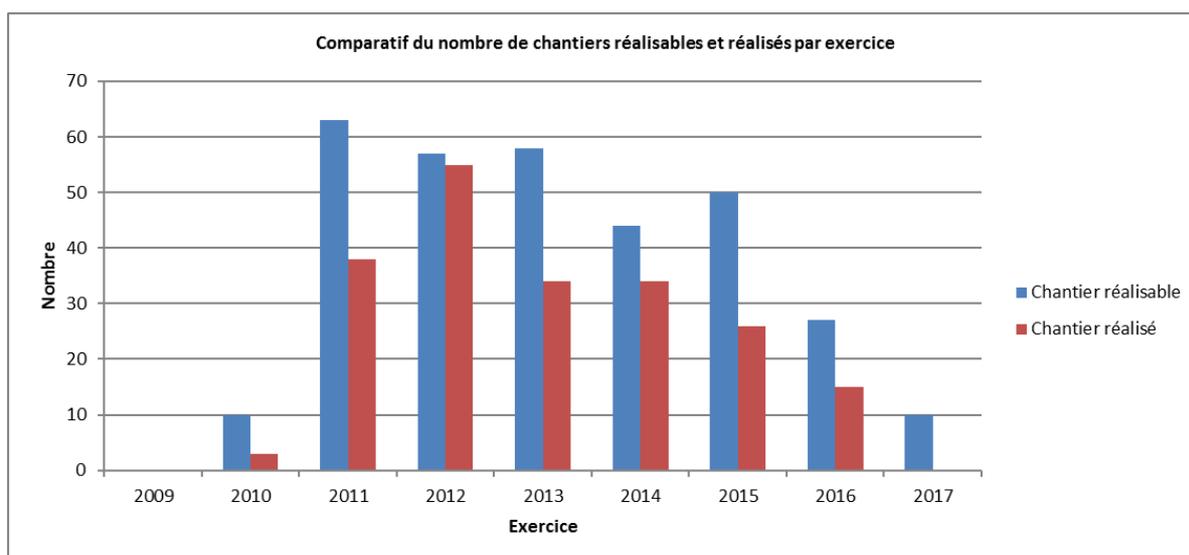

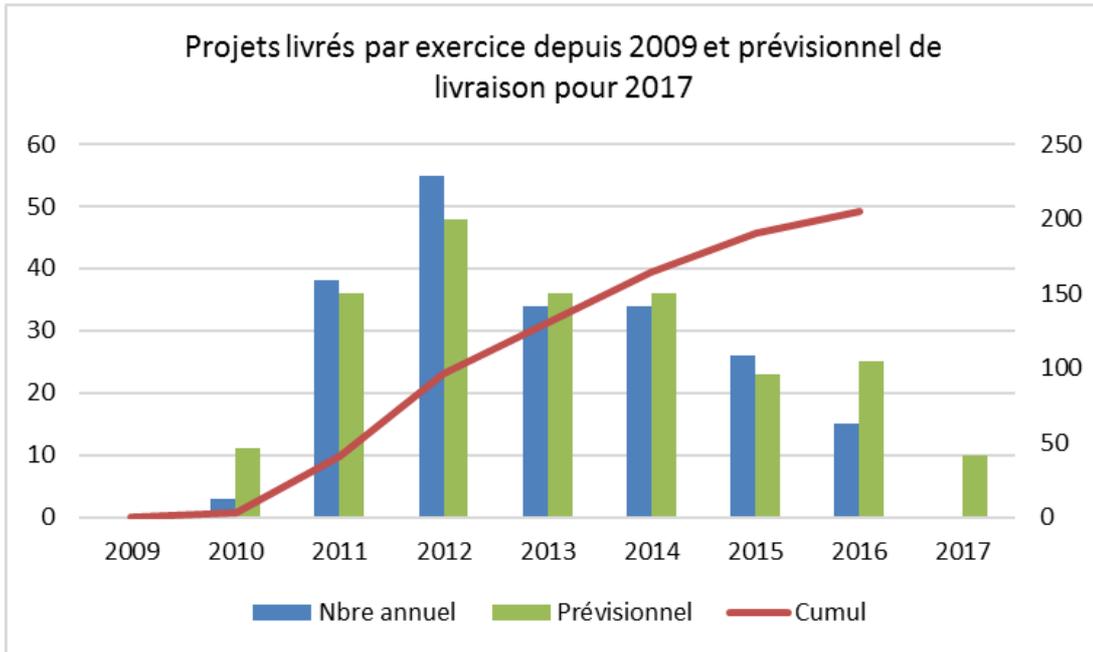

Association Renouveau TEASOA
Programme d'Assainissement Individuel
Bilan physique et financier

Nombre de projets	Numéro de projet	Bénéficiaire	Commune	Milieu	Adresse/Tribu/Lieu-dit	CAPAS		Date CMOD	Coût des travaux	FINANCEMENT DES TRAVAUX		Date Reception	Rémunération opérateur 12% sur coût projet	Observations	
						Date Commission	Coût référence			Montant apport personnel constitué	Montant subvention				
BELEP															
1	12030	BEALO Emmanuela ép. PIDYO	Belep	Tribal	Saint-Louis	06/12/2010	1 329 300	15/04/2011	1 320 000	13 293	1 306 707	20/12/2011	158 400	Chantier fini et réceptionné	
1	12083	BELEP Bérénice	Belep	Tribal	Nianwié	10/09/2012	1 329 300	15/05/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	17/12/2013		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	12084	BOUANAOUÉ Augustin	Belep	Tribal	Ste Marie	10/09/2012	1 329 300	08/04/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	04/03/2014		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	12081	BOUANAOUÉ Delphin	Belep	Tribal	Sainte Croix	18/07/2012	1 329 300	25/09/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	18/02/2014		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	12095	BOUANAOUÉ Philémon	Belep	Tribal	Ste Marie	03/12/2012	1 329 300	08/04/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	17/12/2013		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	12080	BOUEDAOU Simon	Belep	Tribal	Saint Pierre	18/07/2012	1 329 300	08/04/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	17/12/2013		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	12082	DAWILO André	Belep	Tribal	Sainte Thérèse	18/07/2012	1 329 300	08/04/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	18/02/2014		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	12026	DAYE Gaspard	Belep	Tribal	Saint Joachim	18/07/2012	1 329 300	08/04/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	18/02/2014		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	12024	MOILOU Amabii	Belep	Tribal	Saint Pierre	18/07/2012	1 329 300	08/04/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	18/02/2014		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	12094	THALE Gilles	Belep	Tribal	Nianwié	10/09/2012	1 329 300	08/04/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	17/12/2013		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	12097	THALE Juliette	Belep	Tribal	Bwédo	10/09/2012	1 329 300	08/04/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	18/02/2014		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	12096	THALE Michel	Belep	Tribal	Tavédane	01/07/2013	1 329 300		0	0	0			0 Apport non-réglé, dossier annulé à la CAPAS du 25/03/2015	
1	12098	THALE Prospère	Belep	Tribal	Naouny	03/12/2012	1 329 300	17/04/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	17/12/2013		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	12025	WAHOULO Louis	Belep	Tribal	Lieu-dit Bouekavebou	06/12/2010	1 329 300	31/08/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	09/10/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12027	WAHOULO Nelson	Belep	Tribal	Ste Marie	10/09/2012	1 329 300	08/04/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	25/03/2014		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	12085	YARIK Lizianne	Belep	Tribal	Ste Thérèse	10/09/2012	1 329 300	08/04/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	18/02/2014		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
16			BELEP					21 268 800		19 930 200	199 395	19 730 805		317 916	
CANALA															
1	12021	ATAMU Onida née MIDJA	Canala	Tribal	Nexô	06/12/2010	1 329 300	13/05/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	03/04/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12000	BERONON Luc	Canala	Tribal	Gélîma	07/07/2010	1 329 300	04/03/2011	1 325 000	13 293	1 311 707	09/08/2011	159 000	Chantier fini et réceptionné	
1	12086	BERONON Sylvie	Canala	Tribal	Kuiné	03/12/2012	1 329 300	12/02/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	01/04/2014		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	11981	CAGOU Marcel	Canala	Tribal	Gélîma	06/12/2010	1 329 300	13/05/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	14/05/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12001	KAICHOU Georges	Canala	Tribal	Nakéty	07/07/2010	1 329 300	04/10/2010	1 325 000	13 293	1 311 707	01/03/2011	159 000	Chantier fini et réceptionné	
1	12009	KAICHOU Marie	Canala	Tribal	Nexô	18/07/2012	1 329 300	10/12/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	06/05/2014		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	12078	MARAMIN Charles	Canala	Tribal	Nonhoué	18/07/2012	1 329 300	02/10/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	20/03/2014		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	12008	MARAMIN Jean-Cédric	Canala	Tribal	Nonhoué	06/12/2010	1 329 300	23/05/2011	1 325 000	13 293	1 311 707	11/10/2011	159 000	Chantier fini et réceptionné	
1	12003	MOUGHE Joannet	Canala	Tribal	Nonhoué	07/07/2010	1 329 300	08/03/2011	1 325 000	13 293	1 311 707	05/07/2011	159 000	Chantier fini et réceptionné	
1	12028	NONNARO Anicet	Canala	Tribal	Mia	06/12/2010	1 329 300	08/03/2011	1 325 000	13 293	1 311 707	29/05/2012	159 000	Chantier fini et réceptionné	
1	12014	OUECHOU Hélène vve TOMEDI	Canala	Tribal	Gélîma	06/12/2010	1 329 300	14/06/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	03/04/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	11972	PAREOU Maria ép. MEOUAINON	Canala	Tribal	Nanon kénérou	18/07/2012	1 329 300	11/10/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	20/03/2014		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	11982	POINDYNEHITI Adélaïde vve KASOVIMOIN	Canala	Tribal	Nanon kénérou	07/07/2010	1 329 300	04/10/2010	1 325 000	13 293	1 311 707	08/02/2011	159 000	Chantier fini et réceptionné	
1	12069	POUPORON Gustave	Canala	Tribal	Nakéty	03/12/2012	1 329 300	12/02/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	29/04/2014		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	12005	POUPORON Hervé	Canala	Tribal	Nakéty	07/07/2010	1 329 300	10/09/2010	1 325 000	13 293	1 311 707	01/03/2011	159 000	Chantier fini et réceptionné	
1	11941	SOCHOUCOE Mireille	Canala	Tribal	Nakéty	18/07/2012	1 329 300	11/10/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	13/05/2014		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	11968	TIEOU Naomie	Canala	Tribal	Emma	06/12/2010	1 329 300	29/07/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	11/10/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12010	TOMEDI Fabrice	Canala	Tribal	Gélîma	18/07/2012	1 329 300	02/10/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	25/03/2014		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	12070	TONCHANE Xavier	Canala	Tribal	Mia	10/09/2012	1 329 300	22/11/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	27/05/2014		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	11999	TONHOUEI Geneviève vve TARAMOIN	Canala	Tribal	Nakéty	07/07/2010	1 329 300	10/09/2010	1 325 000	13 293	1 311 707	21/12/2010	159 000	Chantier fini et réceptionné	
1	11953	TOUMOIN Stéphane	Canala	Tribal	Méhoué	07/12/2009	1 329 300	23/08/2010	1 325 000	13 293	1 311 707	30/11/2010	159 000	Chantier fini et réceptionné	
21			CANALA					27 915 300		27 876 600	279 153	27 597 447		2 069 064	
HIENGHÈNE															
1	12087	CASELINA Jean-Noël	Hienghène	Tribal	Kouloué	10/09/2012	1 329 300	24/10/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	21/10/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	11965	DYEO Jean Yves	Hienghène	Tribal	Ténème	06/12/2010	1 329 300	10/05/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	21/07/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12039	HAMENE Dave	Hienghène	Tribal	Poindjap	28/03/2011	1 329 300	30/05/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	18/08/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	11993	MAYAT Salomon	Hienghène	Tribal	Werap	06/12/2010	1 329 300	30/03/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	22/07/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	11996	MOUEAOU Yocepha	Hienghène	Tribal	Tendo	06/12/2010	1 329 300	30/03/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	16/08/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12053	OUNINE Alphonsine vve YENTAO	Hienghène	Tribal	Ouaré	20/06/2011	1 329 300	29/07/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	22/11/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	11984	POULAQUA Jeanne née DOREHALIK	Hienghène	Tribal	Tribu de Panié	06/12/2010	1 329 300	13/05/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	30/08/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12040	TJIBAOU Rolland	Hienghène	Tribal	Tiendanite	06/12/2010	1 329 300	30/03/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	04/08/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	11983	WATHEA Joseph	Hienghène	Tribal	Tiendanite	07/12/2010	1 329 300	11/03/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	17/08/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12047	YANEKOUS Christiane	Hienghène	Tribal	Ganem	18/07/2012	1 329 300	24/10/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	18/10/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12093	YENTAO Louise	Hienghène	Tribal	Le Wérap	10/09/2012	1 329 300	22/11/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	28/10/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné	
11			HIENGHÈNE					14 622 300		14 622 300	146 223	14 476 077		1 754 676	
HOUAILLOU															
1	12058	BOERE Genest	Houailou	Tribal	Bâ	18/07/2012	1 329 300	08/10/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	23/11/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	11980	DIUMAHO François	Houailou	Tribal	Gondé	07/12/2009	1 329 300	28/03/2011	1 325 000	13 293	1 311 707	14/10/2011	159 000	Chantier fini et réceptionné	
1	12046	EURIMINDIA Justine vve WAGUE	Houailou	Tribal	Gondé	06/12/2010	1 329 300	13/05/2011	1 325 000	13 293	1 311 707	21/10/2011	159 000	Chantier fini et réceptionné	
1	11874	GOUROU Jacques	Houailou	Tribal	Gouareu	01/07/2013	1 329 300	19/09/2014	1 520 000	13 293	1 506 707	22/07/2015		Forfait annuel Chantier fini et réceptionné	
1	12057	MOREO Kaloye	Houailou	Tribal	Bâ	28/03/2011	1 329 300	14/06/2011	1 325 000	13 293	1 311 707	14/12/2011	159 000	Chantier fini et réceptionné	
1	12067	MOIMBURU Georges	Houailou	Tribal	Mhé	10/09/2012	1 329 300	24/10/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	08/04/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné	

Association Renouveau TEASOA
Programme d'Assainissement Individuel
Bilan physique et financier

Nombre de projets	Numéro de projet	Bénéficiaire	Commune	Milieu	Adresse/Tribu/Lieu-dit	CAPAS		Date CMOD	Coût des travaux	FINANCEMENT DES TRAVAUX		Date Reception	Rémunération opérateur 12% sur coût projet	Observations
						Date Commission	Coût référence			Montant apport personnel constitué	Montant subvention			
1	12052	NERHO Vencelas	Houailou	Tribal	Néaoua	18/07/2012	1 329 300	08/10/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	23/11/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
7			HOUAÏLOU				9 305 100		9 482 900	93 051	9 389 849		955 548	
KAALA-GOMEN														
1	11960	DIANOUMA Joannès	Kaala Gomen	Tribal	Païta	06/12/2010	1 329 300	09/03/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	23/11/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11955	HOURI Florentine vve POY YETHI	Kaala Gomen	Tribal	Baoui	10/09/2012	1 329 300	24/01/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	06/05/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12091	PABOAMA Baléhole vve CAENEMA	Kaala Gomen	Tribal	Ouémo	03/12/2012	1 329 300		0	0	0			0 Personne décédée, dossier annulé à la CAPAS du 25/03/2015
1	12099	TEITY Félix	Kaala Gomen	Tribal	Païta	03/12/2012	1 329 300	24/04/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	18/07/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12106	YALOUA Céline	Kaala Gomen	Tribal	Gamaï	01/07/2013	1 329 300	08/08/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	11/10/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné
5			KAALA-GOMEN				6 646 500		5 317 200	53 172	5 264 028		638 064	
KONÉ														
1	12068	GOROMARA Norbert	Koné	Tribal	Néami	18/07/2012	1 329 300	19/02/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	24/03/2015	Forfait annuel	Chantier fini et réceptionné
1	11974	GOROWIRIDJA Alphonse	Koné	Tribal	Poindah	07/07/2010	1 329 300	19/11/2010	1 329 000	13 293	1 315 707	22/05/2012	159 480	Chantier fini et réceptionné
1	11973	GOROWIRIDJA Daniel	Koné	Tribal	Poindah	07/12/2009	1 329 300	16/06/2010	1 280 000	13 293	1 266 707	30/03/2011	153 600	Chantier fini et réceptionné
1	12004	GOWECEE Marie-Claire	Koné	Tribal	Tribu de Tiaoué	06/12/2010	1 329 300	28/07/2011	1 329 000	13 293	1 315 707	22/11/2011	159 480	Chantier fini et réceptionné
1	11994	MAHOSSEM Régis	Koné	Tribal	Tiaoué	28/03/2011	1 329 300	09/09/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	03/07/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	14031	MEREATU Mézéré Bernard	Koné	Tribal	Netchaot	10/09/2012	1 329 300	12/12/2014	1 329 300	13 293	1 316 007	24/08/2015	Forfait annuel	Chantier fini et réceptionné
1	12048	NAPOARAOE Rose vve POADJA	Koné	Tribal	Poindah	10/09/2012	1 329 300	10/01/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	21/03/2014	Forfait annuel	Chantier fini et réceptionné
1	11992	LOUDARE Cain	Koné	Tribal	Koniambo	28/03/2011	1 329 300	29/02/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	03/12/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11977	POHIJILAN André	Koné	Tribal	Netchaot	07/12/2009	1 329 300	16/06/2010	1 280 000	13 293	1 266 707	14/01/2011	153 600	Chantier fini et réceptionné
1	12056	POUROUDA Brice	Koné	Tribal	Tiakana	20/06/2011	1 329 300	28/07/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	23/10/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11986	UPA Josiane	Koné	Tribal	Netchaot	28/03/2011	1 329 300	14/12/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	08/06/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11991	UPA Marcel	Koné	Tribal	Netchaot	06/12/2010	1 329 300	29/02/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	03/12/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11962	WARU Marie René	Koné	Tribal	netchaot	07/12/2009	1 329 300	16/06/2010	1 280 000	13 293	1 266 707	14/01/2011	153 600	Chantier fini et réceptionné
1	12100	WELET Anna vve PAADO	Koné	Tribal	Néchaot	03/12/2012	1 329 300	08/03/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	04/07/2014	Forfait annuel	Chantier fini et réceptionné
14			KONÉ				18 610 200		18 461 700	186 102	18 275 598		1 577 340	
KOUAOUA														
1	11934	ATE Céra vve GOWEMEUHOU	Kouaoua	Tribal	Ouérou-Pimet	07/07/2010	1 329 300	04/10/2010	1 329 300	13 293	1 316 007	09/08/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1			KOUAOUA				1 329 300		1 329 300	13 293	1 316 007		159 516	
KOUMAC														
1	12039	AROUMA Stéphanie	Koumac	Tribal	Karembé	10/09/2012	1 329 300	08/04/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	25/06/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné
1		WHAAP Antoine	Koumac	Tribal	Wanap	06/12/2010	1 329 300		0	0	0			0 Dossier annulé lors de la CAPAS du 03/12/2012 : apport non réglé
2			KOUMAC				2 658 600		1 329 300	13 293	1 316 007		159 516	
OUEGOA														
1	11956	CANA Christiane	Ouégoa	Tribal	Paraoua	20/06/2011	1 329 300	10/08/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	29/12/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11950	DELHUMEAU Françoise vve YOUNG	Ouégoa	Rural	Lot 9 Tiaré-Amos	07/12/2009	1 329 300	31/01/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	15/12/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12060	MOUEAOU Félix	Ouégoa	Tribal	Saint Thimothée	20/06/2011	1 329 300	06/12/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	03/05/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12108	PEBOU-YANHI Paba	Ouégoa	Tribal	Pouambanou	01/07/2013	1 329 300	21/10/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	25/04/2014	Forfait annuel	Chantier fini et réceptionné
1	12109	PEBOU-YANHI Vincent	Ouégoa	Tribal	Pouambanou	01/07/2013	1 329 300	21/10/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	25/04/2014	Forfait annuel	Chantier fini et réceptionné
1	12064	POUEMOIN Blaise	Ouégoa	Tribal	Paraoua	20/06/2011	1 329 300	13/12/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	10/05/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11959	POUIRIDA Félicité ép. POUEMOIN	Ouégoa	Tribal	Paraoua	07/12/2009	1 329 300	19/07/2010	1 329 300	13 293	1 316 007	09/11/2010	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12038	TCHOEAOUA Gaston	Ouégoa	Tribal	Saint Joseph	18/07/2012	1 329 300	25/09/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	14/11/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11865	TIORAMA Polycarpe	Ouégoa	Tribal	Sainte Anne Bondé	13/03/2013	1 329 300	21/10/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	17/04/2014	Forfait annuel	Chantier fini et réceptionné
1	12031	YOUNG Geoffroy	Ouégoa	Rural	Lot 194 Diahot R. droite	06/12/2010	1 329 300	04/05/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	21/01/2016	159 516	Chantier fini et réceptionné
10			OUEGOA				13 293 000		13 293 000	132 930	13 160 070		1 116 612	
POINDIMIÉ														
1	12072	AMABILI Angèle	Poindimié	Tribal	Ina	10/09/2012	1 329 300	18/12/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	13/12/2013	Forfait annuel	Chantier fini et réceptionné
1	12045	ARAMOTO Gilbert	Poindimié	Tribal	St Thomas	20/06/2011	1 329 300	15/11/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	02/04/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12011	CEDARE-AOUTA Thomas	Poindimié	Tribal	Tibarama	06/12/2010	1 329 300	15/04/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	05/04/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12034	FAKATIKA Akata vve POADAE	Poindimié	Tribal	Paama	06/12/2010	1 329 300	15/04/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	09/11/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12050	KAAEA Julia vve GOROPOUI	Poindimié	Tribal	Ometteux	20/06/2011	1 329 300	13/12/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	19/04/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12029	NAPOE Sylvéri	Poindimié	Tribal	Ometteux	20/06/2011	1 329 300	28/06/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	17/04/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12071	NATU MA MWATEAPO Joseph	Poindimié	Tribal	Ometteux	10/09/2012	1 329 300	26/02/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	13/12/2013	Forfait annuel	Chantier fini et réceptionné
1	12022	NENOU Anna vve TYEA	Poindimié	Tribal	Tiéti	06/12/2010	1 329 300	15/04/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	20/01/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11997	NENOU Michel	Poindimié	Tribal	Poindimié	28/03/2011	1 329 300	23/01/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	11/12/2013	Forfait annuel	Chantier fini et réceptionné
1	11978	POADA Samuel	Poindimié	Tribal	Tyé	06/12/2010	1 329 300	10/05/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	22/03/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11957	POANOUÏ Nazaire	Poindimié	Tribal	Tiéti	06/12/2010	1 329 300	31/05/2010	873 500	13 293	860 207	15/02/2012	125 500	Chantier fini et réceptionné
1	11951	POINRINTYEGUI Bernadette vve GORODUMEBI	Poindimié	Tribal	Timidou	10/09/2012	1 329 300	06/12/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	25/02/2014	Forfait annuel	Chantier fini et réceptionné
1	12090	PRANTYEGIEI-GALALI Yann	Poindimié	Tribal	Saint Denis	03/12/2012	1 329 300	25/06/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	25/02/2014	Forfait annuel	Chantier fini et réceptionné
1	12073	TIEMONHOU Mizaël	Poindimié	Tribal	Tiounaou	18/07/2012	1 329 300	19/10/2012	1 329 300	13 293	1 315 707	14/12/2012	159 480	Chantier fini et réceptionné
1	12063	TYAOU Clément	Poindimié	Tribal	Tioundjep	18/07/2012	1 329 300	19/10/2012	1 329 300	13 293	1 315 707	12/12/2012	159 480	Chantier fini et réceptionné

Association Renouveau TEASOA
Programme d'Assainissement Individuel
Bilan physique et financier

Nombre de projets	Numéro de projet	Bénéficiaire	Commune	Milieu	Adresse/Tribu/Lieu-dit	CAPAS		Date CMOD	Coût des travaux	FINANCEMENT DES TRAVAUX		Date Reception	Rémunération opérateur 12% sur coût projet	Observations
						Date Commission	Coût référence			Montant apport personnel constitué	Montant subvention			
1	11961	TYAOU Michel	Poindimié	Tribal	St Denis	10/09/2012	1 329 300		0	13 293	0		0	annulé à la CAPAS du 25/03/2015, s/demande de Mr formulée par courrier le 11/07/2013
1	11958	TYEA Armand	Poindimié	Tribal	tiéti	06/12/2010	1 329 300	15/04/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	19/04/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11969	WIMIAN Moïse	Poindimié	Tribal	Tyé	06/12/2010	1 329 300	01/06/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	22/03/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
18		POINDIMIÉ					23 927 400		22 142 000	239 274	21 915 719		1 880 154	
PONÉRIHOUE														
1	11848	APIAZARI Ferdinand Atéa	Ponérihouen	Tribal	Grondou	13/03/2013	1 329 300	27/11/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	06/10/2016	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11954	GORDJIA Neil	Ponérihouen	Tribal	Neouta	06/12/2010	1 329 300	11/04/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	02/02/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12101	NIMBAYE Alfred	Ponérihouen	Tribal	Tchamba	13/03/2013	1 329 300	27/11/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	23/05/2016	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12012	SEE André	Ponérihouen	Tribal	Monéo	28/03/2011	1 329 300	19/10/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	10/07/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12023	THEAIN NIGOU Noémie vve ARAMOTO	Ponérihouen	Tribal	Tchamba	07/12/2009	1 329 300	13/06/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	10/07/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12051	WAMO Marthe ép. IHILY	Ponérihouen	Tribal	Embouchure	18/07/2012	1 329 300	08/10/2012	1 329 000	13 293	1 315 707	28/11/2012	159 480	Chantier fini et réceptionné
6		PONÉRIHOUE					7 975 800		7 975 500	79 758	7 895 742		957 060	
POUÉBO														
1	11945	BELEY Béata	Pouébo	Tribal	Colnett	06/12/2010	1 329 300	13/12/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	20/08/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12092	BILOU Jean Luc	Pouébo	Tribal	Tchamboène	03/12/2012	1 329 300	10/03/2014	1 329 300	13 293	1 316 007	12/01/2015	159 516	Forfait annuel Chantier fini et réceptionné
1	12035	BOILOA Jonhston	Pouébo	Tribal	Cabwen	06/12/2010	1 329 300	14/06/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	23/04/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12049	DEDANE Eric	Pouébo	Tribal	Saint Denis Balade	28/03/2011	1 329 300	31/08/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	03/05/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12041	DEDANE Henriette	Pouébo	Tribal	Mahamate	03/12/2012	1 329 300	28/03/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	16/10/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11970	DELRIEU Alice ép. NISHIKUMA	Pouébo	Tribal	Lieu-dit Wabane Saint-Denis	06/12/2010	1 329 300	28/03/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	05/10/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11979	DOUI Théophile	Pouébo	Tribal	Diahoué	07/12/2009	1 329 300	09/08/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	23/04/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11952	NOMOIGNE Bernard	Pouébo	Tribal	Cabwen	06/12/2010	1 329 300	10/05/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	23/04/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11882	NOMOIGNE Léonard	Pouébo	Tribal	Tchamboène	13/03/2013	1 329 300	07/04/2015	1 329 300	13 293	1 316 007	23/12/2015	159 516	Forfait annuel Chantier fini et réceptionné
1	12065	NOMOIGNE Steeve	Pouébo	Tribal	Tchamboène	20/06/2011	1 329 300	09/08/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	23/04/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11870	NONGHAI Jules	Pouébo	Tribal	Saint Denis	13/03/2013	1 329 300	27/11/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	12/01/2015	159 516	Forfait annuel Chantier fini et réceptionné
1	12107	PALAGOTA Valinda	Pouébo	Tribal	Tchamboène	01/07/2013	1 329 300	27/11/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	12/01/2015	159 516	Forfait annuel Chantier fini et réceptionné
1	12110	PIDJO Pierre-César	Pouébo	Rural	Pwirenc	01/07/2013	1 329 300	09/10/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	16/07/2014	159 516	Forfait annuel Chantier fini et réceptionné
1	12105	WALA Marie-Nelly	Pouébo	Tribal	Sainte Marie	01/07/2013	1 329 300	12/03/2014	1 329 300	13 293	1 316 007	12/01/2015	159 516	Forfait annuel Chantier fini et réceptionné
1	11971	WALOUA Nicole	Pouébo	Tribal	Saint Louis	18/07/2012	1 329 300	22/11/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	22/01/2014	159 516	Forfait annuel Chantier fini et réceptionné
15		POUÉBO					19 939 500		19 939 500	199 395	19 740 105		1 276 128	
POUM														
1	11883	BAOU Cliff	Poum	Tribal	Boat Pass	13/03/2013	1 329 300	23/12/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	27/06/2014	159 516	Forfait annuel Chantier fini et réceptionné
1	12016	BAOU Jacques	Poum	Tribal	Aléap Boat Pass	28/03/2011	1 329 300	17/08/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	09/03/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11995	BOAOUVA John	Poum	Tribal	Titch	06/12/2010	1 329 300	16/03/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	09/12/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11964	BOAOUVA Kambo	Poum	Tribal	Titch	06/12/2010	1 329 300	15/04/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	11/06/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11967	DAHMA Léonie vve MALOUNE	Poum	Tribal	Gu Tiabet	28/03/2011	1 329 300	10/03/2014	1 329 300	13 293	1 316 007	27/06/2014	159 516	Forfait annuel Chantier fini et réceptionné
1	12042	DAHMA Malalou vve TIDJINE	Poum	Tribal	Titch	28/03/2011	1 329 300	15/09/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	11/06/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12103	DAHOTE Evanès	Poum	Tribal	Tiabet	13/03/2013	1 329 300	21/10/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	06/12/2013	117 282	Chantier fini et réceptionné
1	11963	DAHOTE Raoul	Poum	Tribal	Tiabet	06/12/2010	1 329 300	15/04/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	02/03/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12104	HAPIE Bernard	Poum	Tribal	Tiabet	01/07/2013	1 329 300	26/11/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	20/01/2014	159 516	Forfait annuel Chantier fini et réceptionné
1	11998	MALOUNE Tadalou vve WHAAP	Poum	Rural	Lot 65 Néhoué	20/06/2011	1 329 300	25/06/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	29/08/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12066	NIAEMA Hélène vve TCHOVANILI	Poum	Tribal	Bouarou	10/09/2012	1 329 300	18/12/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	15/04/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11966	ONGAT Thomas	Poum	Tribal	Djou Tiabet	28/03/2011	1 329 300	24/07/2014	1 329 300	13 293	1 316 007	07/11/2014	159 516	Forfait annuel Chantier fini et réceptionné
1	12102	PADOM Willion	Poum	Tribal	Tiabet	03/12/2012	1 329 300	04/09/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	18/11/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11985	PIDJO Monique vve SINEDROSSA	Poum	Tribal	Titch	10/09/2012	1 329 300	04/09/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	29/11/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12015	TIDJINE Essera née BOAOUVA	Poum	Tribal	Titch	06/12/2010	1 329 300	15/04/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	03/02/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
15		POUM					19 939 500		19 939 500	199 395	19 740 105		1 712 442	
POYA														
1	11949	BOKOE-GOIN Michel	Poya	Tribal	Tribu de Nékliai	28/03/2011	1 329 300	05/10/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	15/05/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11988	BOREKAOU Berthin	Poya	Tribal	Gohapin	07/07/2010	1 329 300	05/08/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	20/06/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12019	GOYETA-POINDET Maurice	Poya	Tribal	Tribu de Gohapin	06/12/2010	1 329 300	15/09/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	24/10/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12017	MEANDU GORODE Julien	Poya	Tribal	Gohapin	06/12/2010	1 329 300	10/11/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	10/01/2013	159 516	Forfait annuel Chantier fini et réceptionné
1	12043	MEANDU GORODE Marlène	Poya	Tribal	Gohapin	06/12/2010	1 329 300	05/08/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	28/11/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1		MEANDU GORODE Pierre-Chanel	Poya	Tribal	Gohapin	06/12/2010	1 329 300		0	13 293	0		0	annulé lors de la CAPAS du 03/12/2012 alors que apport réglé
1		MEANDU POUVEU Noël	Poya	Tribal	Gohapin	06/12/2010	1 329 300		0	0	0		0	annulé lors de la CAPAS du 03/12/2012 : apport non réglé
1	11976	MEUREUREU GOWÉ Armand	Poya	Tribal	Ouendji	07/12/2009	1 329 300	30/06/2010	1 329 300	13 293	1 316 007	15/05/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11987	MEUREUREU-GOWE Christian	Poya	Tribal	Montfaoué	06/12/2010	1 329 300	05/08/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	15/05/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11975	MEUREUREU-YARI M.-Madeleine vve BOKOE-GOWE	Poya	Tribal	Montfaoué	07/12/2009	1 329 300	08/07/2010	1 329 300	13 293	1 316 007	15/05/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	11990	NEGA KAVITYA Stéphane	Poya	Tribal	Nékliai	06/12/2010	1 329 300	22/04/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	15/05/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12044	POINRIN NAOUYA Jean-Yves	Poya	Tribal	Gohapin	06/12/2010	1 329 300	15/09/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	24/10/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
1	12018	WIN-NEMOU Augustine	Poya	Tribal	Tribu de Gohapin	06/12/2010	1 329 300	30/06/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	15/05/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné
13		POYA					17 280 900		14 622 300	159 516	14 476 077		1 595 160	

Association Renouveau TEASOA
Programme d'Assainissement Individuel
Bilan physique et financier

Nombre de projets	Numéro de projet	Bénéficiaire	Commune	Milieu	Adresse/Tribu/Lieu-dit	CAPAS		Date CMOD	Coût des travaux	FINANCEMENT DES TRAVAUX		Date Reception	Rémunération opérateur 12% sur coût projet	Observations	
						Date Commission	Coût référence			Montant apport personnel constitué	Montant subvention				
TOUHO															
1	12007	AMOUINE Salomé vve KEPAA	Touho	Tribal	Koé	06/12/2010	1 329 300	10/05/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	30/06/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12074	BOUILLANT Aymerick	Touho	Tribal	Congouma	10/09/2012	1 329 300	24/10/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	12/11/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	11989	BOUILLANT Mathéo	Touho	Tribal	Tiouandé	06/12/2010	1 329 300	28/03/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	21/07/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12002	DAOULO Gaston	Touho	Tribal	Paola	20/06/2011	1 329 300	27/07/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	09/03/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12076	HOUON Jules	Touho	Tribal	Pombeï	10/09/2012	1 329 300	05/11/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	26/04/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12020	OUTYANE Baptiste	Touho	Tribal	Ouanache	28/03/2011	1 329 300	30/05/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	01/12/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12013	OUTYOUTE Michel	Touho	Tribal	Tipoiapie	06/12/2010	1 329 300	22/04/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	05/07/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	11948	POBATTY Frédéric	Touho	Tribal	Koé	06/12/2010	1 329 300	16/03/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	30/06/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12088	DIHAN LEOPOLD	Touho	Tribal	Tiwaé	18/07/2012	1 329 300	24/10/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	27/11/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12032	POIGOUNE Tieou	Touho	Tribal	Poyes	28/03/2011	1 329 300	30/05/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	09/03/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12059	POUANINE Antionien	Touho	Tribal	Touho Mission	28/03/2011	1 329 300	30/05/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	15/02/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	14004	POUIHAMBOUTTE Madeleine vve WAKA	Touho	Tribal	Kokingone	13/03/2013	1 329 300	10/10/2013	1 329 300	13 293	1 316 007	23/01/2015	Forfait annuel	Chantier fini et réceptionné	
1	12006	TEHMI Marie Josephine	Touho	Tribal	Maina	28/03/2011	1 329 300	30/05/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	30/11/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12054	TIAHIN Cécile vve THIPINE	Touho	Tribal	Congouma	10/09/2012	1 329 300	24/10/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	15/01/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12055	TIAHIN Marie Astride	Touho	Tribal	Congouma	10/09/2012	1 329 300	22/11/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	07/11/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12033	TIHONOUTE Marie Prisca	Touho	Tribal	Congouma	28/03/2011	1 329 300	30/05/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	30/12/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12062	TIHONOUTE Michel	Touho	Tribal	Congouma	18/07/2012	1 329 300	24/10/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	22/11/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12077	TIOUIHENE Lolita	Touho	Tribal	Vieux Touho	18/07/2012	1 329 300	02/10/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	20/12/2012	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1		TIOUIHENE Martial	Touho	Tribal	Vieux Touho	20/06/2011	1 329 300		0	13 293	0			0 annulé lors de la CAPAS du 03/12/2012 s/demande du client	
1	12089	TOPOUENE Simon	Touho	Tribal	Congouma	18/07/2012	1 329 300	31/08/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	15/01/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12061	TYAKETOU Rock	Touho	Tribal	Congouma	10/09/2012	1 329 300	19/10/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	04/11/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12075	WAKA CEOU François	Touho	Tribal	Pombeï	10/09/2012	1 329 300	05/11/2012	1 329 300	13 293	1 316 007	19/04/2013	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12036	WEDOÏ Philippe	Touho	Tribal	Tiouandé	28/03/2011	1 329 300	30/05/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	21/12/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné	
1	12037	WHANHI Blaise	Touho	Tribal	Congouma	28/03/2011	1 329 300	30/05/2011	1 329 300	13 293	1 316 007	30/12/2011	159 516	Chantier fini et réceptionné	
24		TOUHO					31 903 200			30 573 900	319 032	30 268 161		3 509 352	
178		TOTAUX					236 615 400			225 505 900	2 312 982	224 561 797		19 678 548	

Association Renouveau TEASOA
Programme d'Assainissement Individuel
Bilan physique et financier

Nombre de projets	Numéro de projet	Bénéficiaire	Commune	Milieu	Adresse/Tribu/Lieu-dit	CAPAS		Date CMOD	Coût des travaux	FINANCEMENT DES TRAVAUX		Date Réception	Rémunération opérateur 12% sur coût projet	Observations
						Date Commission	Coût référence			Montant apport personnel constitué	Montant subvention			
BELEP														
1	14683	DAYE Théophane	Belep	Tribal	Saint Joachim	10/03/2014	1 824 000		0	0	0			En attente règlement de l'apport personnel
1	15163	POITHILI Vince	Belep	Tribal	Lieu-dit Aratalo	10/03/2014	1 824 000	18/07/2014	1 824 000	15 200	1 808 800	07/07/2016	Forfait annuel	Chantier fini et réceptionné
1	15517	TEAMBOUEONE Ursula	Belep	Tribal	Sainte Anne	10/03/2014	1 824 000	02/06/2014	1 824 000	15 200	1 808 800	07/07/2016	Forfait annuel	Chantier fini et réceptionné
3							5 472 000		3 648 000	30 400	3 617 600			
CANALA														
1	14536	MIDJA Simone	Canala	Tribal	Ouassé	10/03/2014	1 824 000	31/07/2014	1 824 000	15 200	1 808 800	23/06/2015	Forfait annuel	Chantier fini et réceptionné
1							1 824 000		1 824 000	15 200	1 808 800			
HIENGHÈNE														
1	15408	BOUARAT Bouaoui vve OUILLATTE	Hienghène	Tribal	Panié	10/03/2014	1 560 000	16/07/2014	1 560 000	15 200	1 504 800		Forfait annuel	Chantier en cours
1	15596	HIAMPAREMANE Monique	Hienghène	Tribal	Wérap	21/08/2014	1 520 000	11/09/2014	1 520 000	15 200	1 504 800	04/08/2015	Forfait annuel	Chantier fini et réceptionné
2							3 080 000		3 080 000	30 400	3 009 600			
KAALA-GOMEN														
1	15289	TEIN-TAOUVA Charles	Kaala Gomen	Tribal	Gamaï	10/03/2014	1 520 000	26/06/2014	1 520 000	15 200	1 504 800	27/11/2014		Chantier fini et réceptionné
1	15382	DABEWIANOU Louis	Kaala Gomen	Tribal	Tégon	10/03/2014	1 520 000	15/10/2014	1 520 000	15 200	1 504 800	19/03/2015		Chantier fini et réceptionné
1	15473	POY-YETHI Patrick	Kaala Gomen	Tribal	Baganda	10/03/2014	1 520 000	16/07/2014	1 520 000	15 200	1 504 800	27/11/2014		Chantier fini et réceptionné
1	15499	TEIN-DIA Nadia	Kaala Gomen	Tribal	Pouéné	10/03/2014	1 520 000	02/06/2014	1 520 000	15 200	1 504 800	27/11/2014		Chantier fini et réceptionné
1	17210	TCHADINOUMA Camille	Kaala Gomen	Tribal	Ouéholle	24/11/2014	1 824 000	25/03/2015	1 824 000	15 200	1 808 800	21/07/2015		Chantier fini et réceptionné
1	15290	TEIN-TAOUVA Richard	Kaala Gomen	Tribal	Gamai	24/11/2014	1 520 000	20/02/2015	1 520 000	15 200	1 504 800	07/05/2015		Chantier fini et réceptionné
1	17072	THEABOINOUE Pierre	Kaala Gomen	Tribal	Ouéinou	24/11/2014	1 824 000	04/02/2015	1 824 000	15 200	1 808 800	21/07/2015		Chantier fini et réceptionné
7							11 248 000		11 248 000	106 400	11 141 600			
OUEGOA														
1	15392	PEBOU-YANHII Fabrice	Ouégoa	Tribal	Pouembanou	10/03/2014	1 824 000	23/04/2014	1 824 000	15 200	1 808 800	30/10/2014		Chantier fini et réceptionné
1	17273	DIANOU Martial	Ouégoa	Tribal	Saint Pierre	24/11/2014	1 520 000	03/03/2015	1 520 000	15 200	1 504 800	16/09/2015		Chantier fini et réceptionné
1	17045	THEAIN-NIGOU Giovanni	Ouégoa	Tribal	Saint Jean Baptiste	24/11/2014	1 520 000	30/01/2015	1 520 000	15 200	1 504 800	16/09/2015		Chantier fini et réceptionné
3							4 864 000		4 864 000	45 600	4 818 400			
POINDIMIÉ														
1	12632	NANYAKARAWA Moise	Poindimié	Tribal	Néssapôé	24/11/2014	1 520 000		0	15 200	0			A annuler : projet pour un logement neuf HPN en cours
1	15124	POAOLA Antoine	Poindimié	Tribal	Tyé	24/11/2014	1 520 000		0	0	0			A annuler : projet pour un logement neuf HPN en cours
1	14614	POINDIPENDA Christophe	Poindimié	Tribal	Tiéti	10/03/2014	1 520 000	05/11/2014	1 556 600	15 200	1 504 800	30/09/2016		Chantier fini et réceptionné
1	12639	POINRIN-POARO Lino	Poindimié	Tribal	Saint Denis	21/08/2014	1 520 000	05/11/2014	1 556 600	15 200	1 504 800	30/09/2016		Chantier fini et réceptionné
4							6 080 000		3 113 200	45 600	3 009 600			
PONÉRIHOUE														
1	14570	GOROATU Louis Alfred	Ponérihouen	Tribal	Tchamba	10/03/2014	1 520 000	17/12/2014	1 520 000	15 200	1 504 800	23/12/2016		Chantier fini et réceptionné
1	15151	POREMPŌEA Sarraïl ép. NIMBAYE	Ponérihouen	Tribal	Tchamba	10/03/2014	1 824 000	14/12/2015	1 520 000	15 200	1 504 800	23/05/2016		Chantier fini et réceptionné
1	17333	ARAMOTO Styves	Ponérihouen	Tribal	Goa	24/11/2014	1 520 000	07/10/2016	1 520 000	15 200	1 504 800			Chantier en cours
3							4 864 000		4 560 000	45 600	4 514 400			
POUÉBO														
1	15139	BALADE David	Pouébo	Tribal	Sainte Marie Balade	21/08/2014	1 824 000	04/02/2015	1 824 000	15 200	1 808 800			Chantier en cours
1	13603	SOLOI René	Pouébo	Tribal		21/08/2014	1 824 000	15/10/2014	1 824 000	15 200	1 808 800	12/11/2015		Chantier fini et réceptionné
1	15863	AMBOYE Ambroise	Pouébo	Tribal	Saint Paul Balade	24/11/2014	1 824 000	12/10/2015	1 824 000	15 200	1 808 800	14/09/2016		Chantier fini et réceptionné
3							5 472 000		5 472 000	45 600	5 426 400			
POUM														
1	15492	WILLIAMS Joël	Poum	Tribal	Tiabet	10/03/2014	1 824 000	18/07/2014	1 824 000	15 200	1 808 800	07/11/2014		Chantier fini et réceptionné
1	14416	POLO Ludovic	Poum	Tribal	Tiabet	21/08/2014	1 824 000	15/10/2014	1 824 000	15 200	1 808 800	19/03/2015		Chantier fini et réceptionné
1	17054	PIDJO René	Poum	Tribal	Tiabet	24/11/2014	1 824 000	13/02/2015	1 824 000	15 200	1 808 800	27/07/2015		Chantier fini et réceptionné
3							1 824 000		1 824 000	15 200	1 808 800			
POYA														
1	15923	BOKŌE-GŌWE Ferry	Poya	Tribal	Montfaoué	10/03/2014	1 520 000	12/12/2014	1 520 000	15 200	1 504 800	23/04/2015		Chantier fini et réceptionné
1	16148	MEANDU-GORO PEJIDA Pierre André	Poya	Tribal	Gohapin	24/11/2014	1 824 000	04/12/2015	1 824 000	15 200	1 808 800			Chantier en cours
2							3 344 000		3 344 000	30 400	3 313 600			
TOUHO														
1	15467	GORŌPOADJILE Henri	Touho	Tribal	Pombéi	10/03/2014	1 520 000	16/07/2014	1 520 000	15 200	1 504 800	23/01/2015		Chantier fini et réceptionné
1	14826	KALENE Ouagaillé	Touho	Tribal	Tiouandé	24/11/2014	1 520 000	03/03/2015	1 520 000	15 200	1 504 800	08/11/2016		Chantier fini et réceptionné
1	14794	PAUOUEA Véronique ép. KALENE	Touho	Tribal	Tiouandé	10/03/2014	1 520 000	16/07/2014	1 520 000	15 200	1 504 800	01/06/2015		Chantier fini et réceptionné
1	15159	POIBA Adolphe	Touho	Tribal	Vieux Touho	10/03/2014	1 520 000	16/07/2014	1 520 000	15 200	1 504 800	01/06/2015		Chantier fini et réceptionné
1	15557	TIDIITE Doui	Touho	Rural	Tiwaka	21/08/2014	1 520 000	23/06/2015	1 520 000	15 200	1 504 800	14/11/2016		Chantier fini et réceptionné
1	14633	TIEOU Hélène	Touho	Tribal	Paola-Poyes	21/08/2014	1 520 000	17/10/2014	1 520 000	15 200	1 504 800	01/06/2015		Chantier fini et réceptionné
6							9 120 000		9 120 000	91 200	9 028 800			
VOH														
1	15311	POUAMATE Dogo	Voh	Tribal	Ouélisse	10/03/2014	1 520 000		0	0	0			Personne décédée le 13/07/2014, dossier annulé à la CAPAS du 25/03/2015
1							1 520 000		0	0	0			
38							58 712 000 F		52 097 200 F	501 600 F	51 497 600 F			

**Programme d'Assainissement Individuel
Bilan physique et financier**

Nombre de projets	N° projet	Bénéficiaire	Commune	Milieu	Adresse/Tribu/Lieu-dit	CAPAS		Date CMOD	Coût des travaux	FINANCEMENT DES TRAVAUX		Date Réception	Observations
						Date Commission	Coût référence			Montant apport personnel constitué	Montant subvention		
CANALA													
1	17254	MARAMIN Yannick	Canala	Tribal	Nonhoué Boakaine	25/03/2015	1 674 000	19/06/2015	1 674 000	16 740	1 657 260	10/11/2015	Chantier fini et réceptionné
1	CANALA						1 674 000		1 674 000	16 740	1 657 260		
KAALA-GOMEN													
1	17614	BOKOLA MARIE LINE	Kaala Gomen	Tribal	Baguanda	28/10/2015	1 674 000	10/05/2016	1 674 000	16 740	1 657 260	01/07/2016	Chantier fini et réceptionné
1	17670	THEGOMEN PATRICE	Kaala Gomen	Tribal	Baoui Saint-Pierre	28/10/2015	1 674 000	06/04/2016	1 674 000	16 740	1 657 260	01/07/2016	Chantier fini et réceptionné
1	17656	YALOUUMA EDMOND	Kaala Gomen	Tribal	Gamaï	28/10/2015	1 674 000	10/05/2016	1 674 000	16 740	1 657 260	01/07/2016	Chantier fini et réceptionné
3	KAALA-GOMEN						5 022 000		5 022 000	50 220	4 971 780		
KONÉ													
1	18191	NEDJIARA ELIANE	Koné	Tribal	Baco	28/10/2015	1 674 000	19/09/2016	1 674 000	16 740	1 657 260		Travaux en cours
1	KONÉ						1 674 000		1 674 000	16 740	1 657 260		
POINDIMIÉ													
1	14641	GOBWIA Nadège	Poindimié	Tribal	Bayes	25/03/2015	1 674 000		0	16 740	0		AE à mettre en place
1	POINDIMIÉ						1 674 000		0	16 740	0		
PONÉRIHOUE													
1	15627	GORODUMIMBI Mickaël	Ponérihouen	Tribal	Tchamba	25/03/2015	2 008 800		0				En attente règlement de l'apport personnel
1	PONÉRIHOUE						2 008 800		0	0	0		
POUÉBO													
1	17715	GNAI ANTOINE	Pouébo	Tribal	Saint-Denis - Balade	28/10/2015	2 008 800		0	16 740	0		CMOD à mettre en place
1	17356	KALENE Suzanne	Pouébo	Tribal	Saint Louis	25/03/2015	2 008 800		0	16 740	0		CMOD à mettre en place
2	POUEBO						4 017 600		0	33 480	0		
9	TOTAUX						16 070 400 F		8 370 000 F	133 920 F	8 286 300 F		
